


Tollare Finplanering

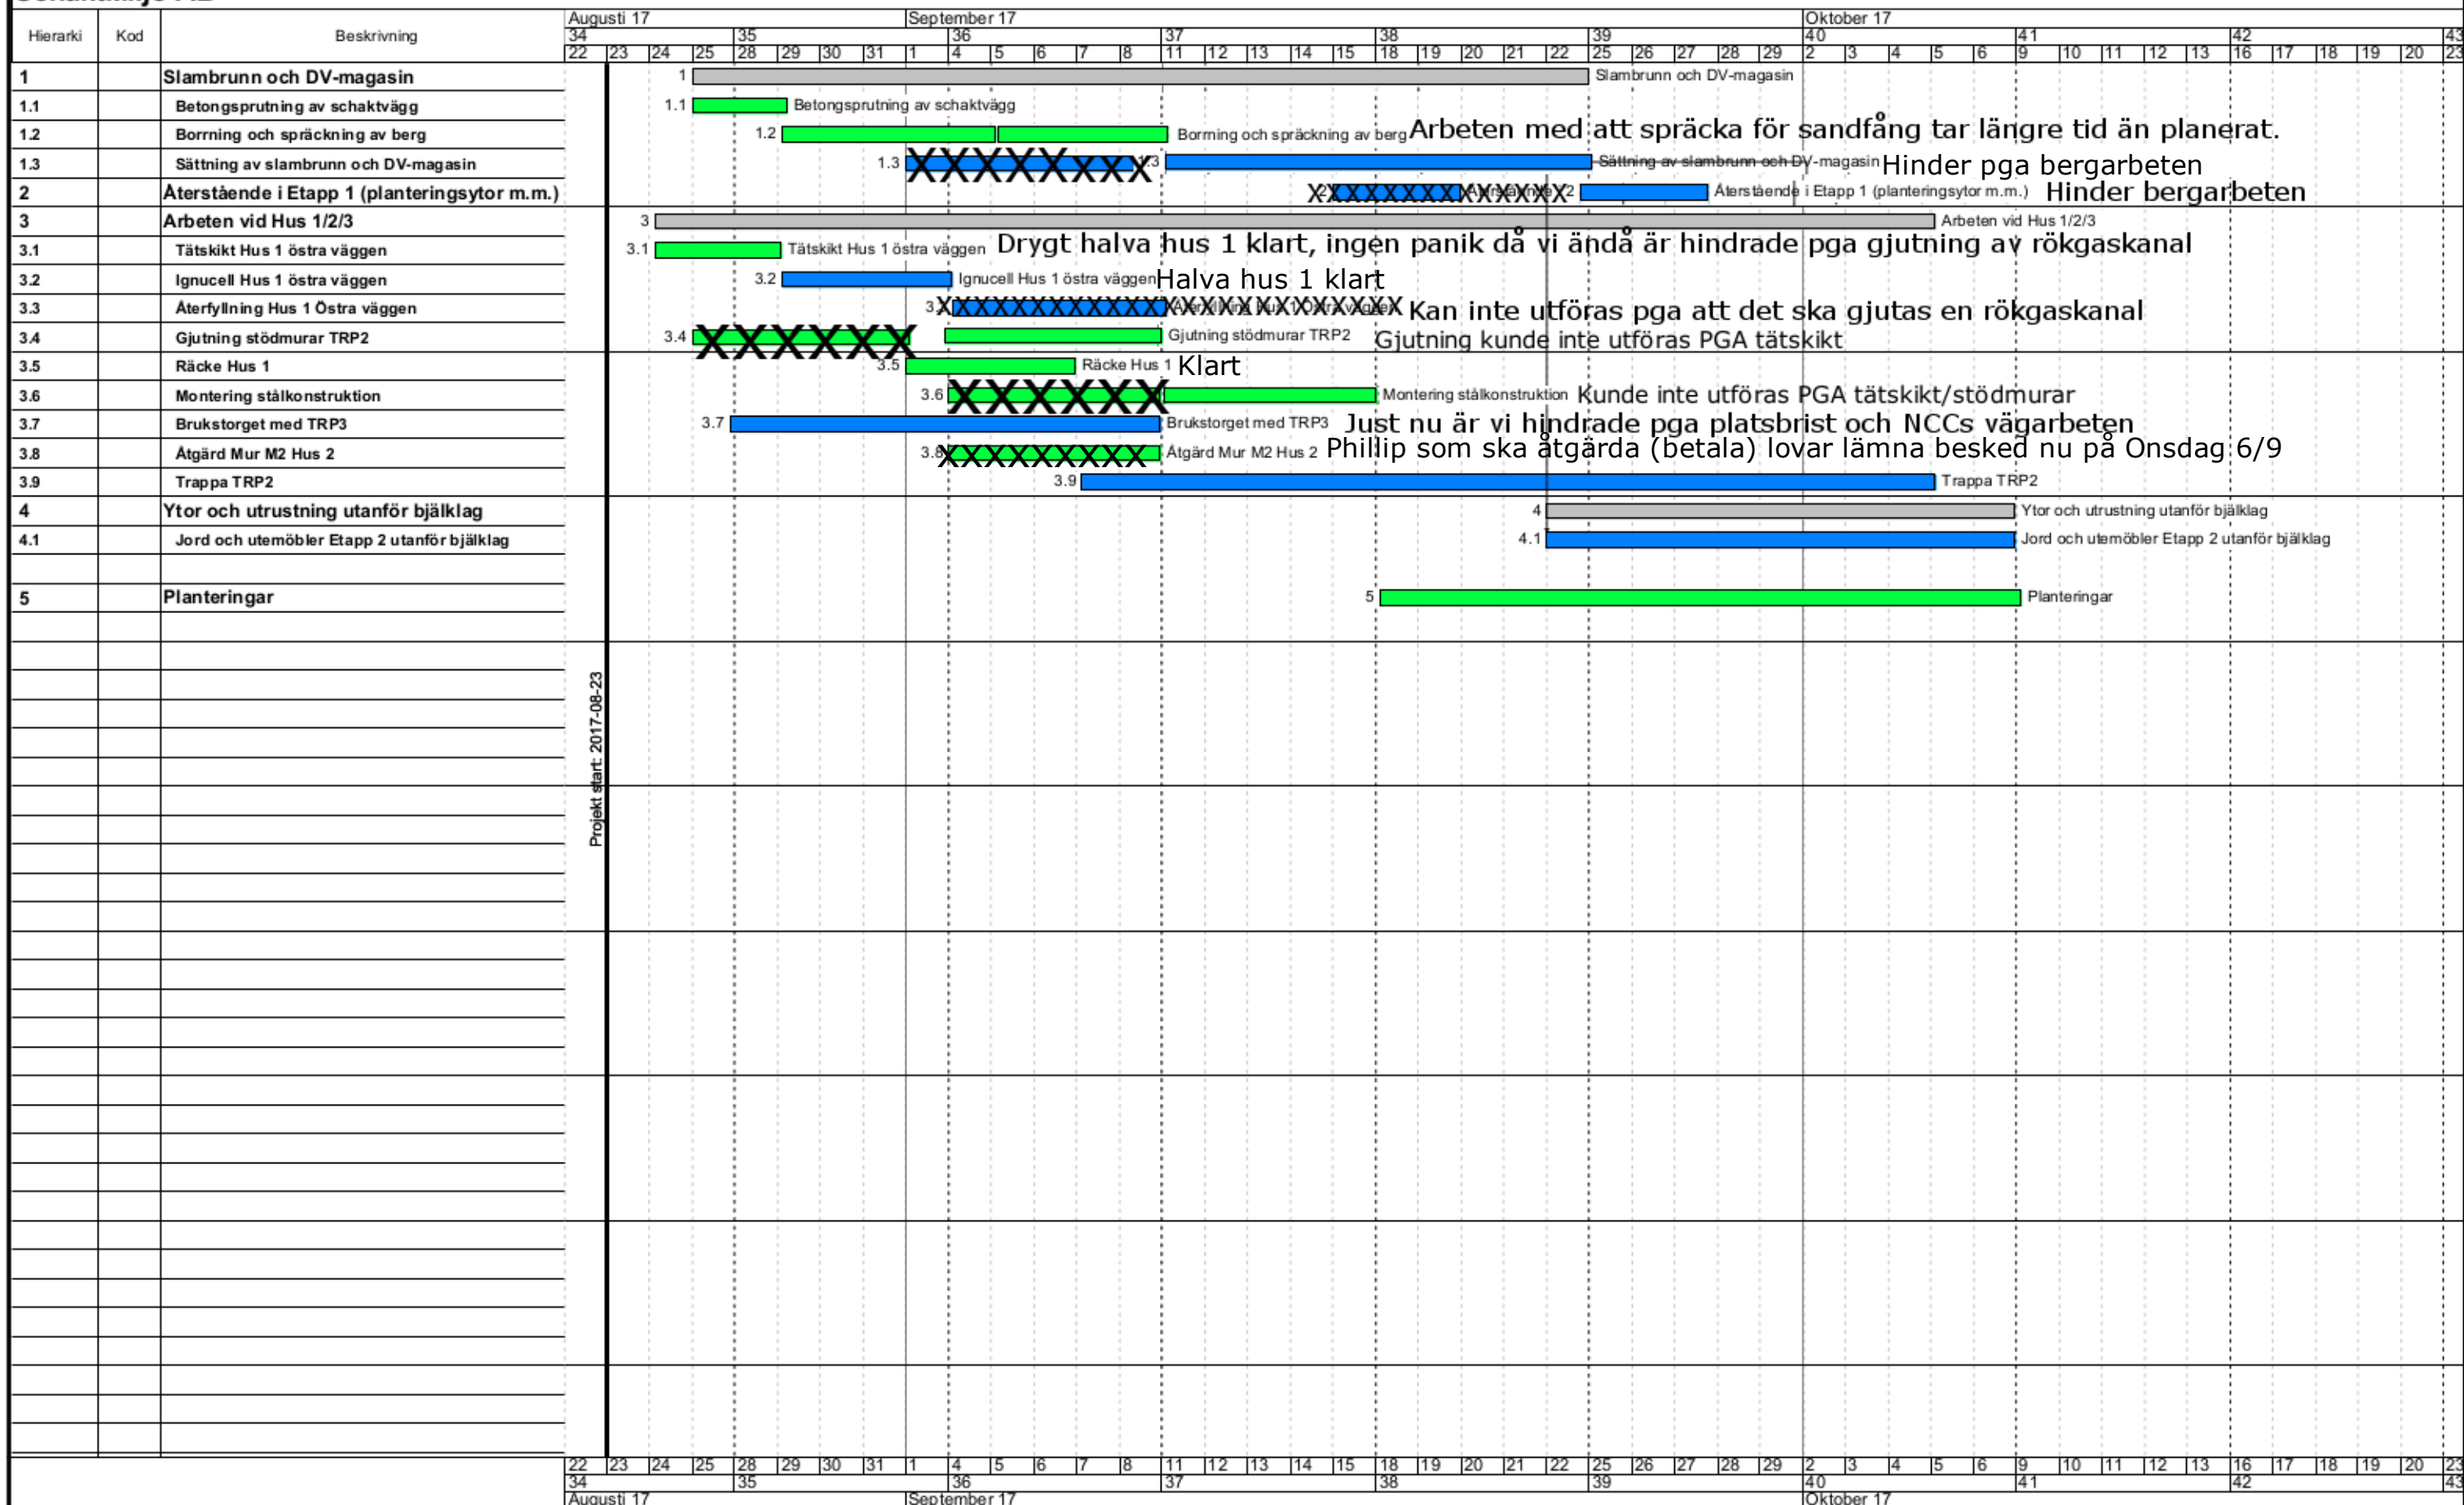

Projekt start: 2017-08-23

Arbeten med att spräcka för sandfång tar längre tid än planerat.
 Hinder pga bergarbeten
 Hinder bergarbeten
 Aterstående i Etapp 1 (planteringsytor m.m.)
 Aterstående i Etapp 1 (planteringsytor m.m.)
 Arbeten vid Hus 1/2/3
 Drygt halva hus 1 klart, ingen panik då vi ändå är hindrade pga gjutning av rökgaskanal
 Halva hus 1 klart
 Kan inte utföras pga att det ska gutas en rökgaskanal
 Gjutning kunde inte utföras PGA tätskikt
 Klart
 Kunde inte utföras PGA tätskikt/stödmurar
 Just nu är vi hindrade pga platsbrist och NCCs vägarbeten
 Philip som ska åtgärda (betala) lovar lämna besked nu på Onsdag 6/9
